



AI-агент проверки целевого использования льготных кредитов

Тестовое задание: Бизнес-аналитик + Project-менеджер
(проверка пакета до заявления платежа в банк)

Выполнил: gibberie

МОСКВА
2026

Оглавление

Введение	3
1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам	4
2. Ключевой бизнес-процесс: первичная проверка пакета	5
3. Дорожная карта пилота (2 месяца).....	7
4. Процесс работы с заказчиком и командой.....	8
5. Мотивация участия в проекте.....	9
Список литературы.....	10

Введение

Разработка любого программного продукта начинается не с кода, а с понимания задачи. Для AI-агента проверки целевого использования льготных кредитов это особенно критично: цена ошибки здесь — не абстрактный «баг», а реальный отказ банка и репутационные потери клиента. Поэтому настоящая работа посвящена не технической реализации, а бизнес-аналитической и управленческой проработке проекта — от сбора требований до плана двухмесячного пилота.

Специфика проекта в том, что ключевое знание распределено между несколькими группами людей и нигде не зафиксировано полностью. Операционный отдел клиента «Русское поле» владеет фактической процедурой проверки и знает, какие ошибки чаще всего приводят к отказам. Юристы и методологи — источник истины по правилам льготных программ (федеральной, бывшей 1528, и областной), которые к тому же периодически меняются. Служба информационной безопасности определяет рамки работы с персональными и финансовыми данными. Разработка оценивает техническую реализуемость в сроки пилота. Задача аналитика — собрать эти фрагменты в согласованную и непротиворечивую картину, а задача проектного менеджера — превратить её в выполнимый план.

Ключевой принцип, проходящий через весь документ, — приоритет главной метрики: агент не должен пропускать платежи, которые нельзя проводить за счёт льготного кредита. Этот критерий задаёт логику поведения агента в спорных ситуациях и определяет как формулировку требований, так и критерии приёмки пилота. Всё остальное — выбор процессов, статусов, вех дорожной карты — подчинено этой главной цели.

Работа построена в пять разделов. В первом сформулированы вопросы к заказчику и стейкхолдерам, снимающие неопределённость в трёх плоскостях: бизнес-цель, правила проверки, ограничения по данным и безопасности. Во втором подробно описан ключевой бизнес-процесс — первичная проверка пакета документов перед авансовым платежом — с текстовым сценарием и схемой потока со статусами. Третий раздел содержит дорожную карту двухмесячного пилота: шесть вех с критериями готовности, ролями, ключевыми рисками и целевыми метриками. Четвёртый описывает процесс работы с заказчиком и командой — форматы, частоту и фокус коммуникаций. Пятый посвящён мотивации участия в проекте. Завершает работу заключение и список использованных источников. Такая структура отражает главный принцип грамотного анализа: каждое проектное решение — вопрос, процесс, веха плана — принимается не само по себе, а ради управляемого снижения проектного риска и достижения измеримого результата, значимого для заказчика.

1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Девять вопросов, которые я задам в первую очередь: кому адресован, зачем нужен ответ и какой риск закрывает. Стейкхолдеры — казначейство, бухгалтерия, юристы, IT.

№	Кому	Вопрос	Зачем / какой риск
1	Операционный отдел	Какой набор проверок чаще всего приводит к отказам банка: просрочка, некомплект, нецелевое назначение?	Зачем: определяет, что автоматизировать первым для максимального эффекта Риск: автоматизацию редких проверок вместо дающих отказы
2	Казначейство	Что значит «можно заявлять на 100%»: какие условия должны совпасть для отправки без перепроверки?	Зачем: формирует точное определение готовности и критерии приёмки Риск: разночтение в том, что считать пройденной проверкой
3	Юристы	Где хранятся актуальные правила программ (1528, областной), как часто меняются, кто обновляет?	Зачем: правила — источник истины; версионность критична Риск: проверку по устаревшим условиям и неверный вывод
4	Казначейство	Что хуже: ложное «нельзя» (лишняя работа) или ложное «можно» (запрещённый платёж в банк)?	Зачем: задаёт порог уверенности и политику «ручная проверка» Риск: пропуск запрещённого платежа — главная метрика
5	Бухгалтерия	Насколько стандартизированы входные документы (УПД, акты): единые формы или свои шаблоны и разные сканы?	Зачем: определяет сложность OCR и реалистичность MVP Риск: недооценку распознавания и срыв сроков
6	IT / ИБ	Где тестовый набор (S3, ресурс клиента), допустима ли внешняя LLM или только GigaChat на контуре?	Зачем: определяет архитектуру и выбор LLM с учётом ИБ Риск: нарушение политики ИБ при обработке фуддокументов
7	Казначейство	По авансам: нормальный срок появления закрывающих документов и что считать критичным расхождением?	Зачем: настраивает пост-контроль и пороги сигнализации Риск: ложные срабатывания или пропуск расхождений
8	Руководитель	Какие метрики в дашборде нужны для решения о масштабировании (доля без доработки, скорость)?	Зачем: формирует требования к аналитике и критерий успеха Риск: запуск без измеримого критерия ценности
9	IT / данные	Можем ли получить размеченный набор «прошёл/не прошёл банк» для проверки качества до пилота?	Зачем: нужен эталон для измерения главной метрики Риск: невозможность оценить, пропускает ли агент нарушения

2. Ключевой бизнес-процесс: первичная проверка пакета

Выбран процесс первичной проверки пакета документов перед авансовым платежом — до заявления в банк. Он напрямую обслуживает критическую метрику «не пропустить запрещённый платёж».

Основной сценарий

- Специалист загружает пакет документов и выбирает льготную программу.
- Агент извлекает ключевые параметры: контрагент, сумма, дата, предмет оплаты, номенклатура, количество, сроки, подписи и печати.
- Проверка комплектности пакета по требованиям выбранной программы.
- Проверка правил: целевое назначение, отсутствие просрочки, наличие реквизитов, соответствие договора и спецификации.
- Формирование статуса и краткого отчёта с объяснением причины вывода.


Три статуса на выходе

- «**Можно заявлять**» — все условия соблюдены, уверенность высокая; пакет готов к отправке.
- «**Нельзя заявлять**» — найдено критичное нарушение (просрочка, нецелевое назначение, отсутствует обязательный документ); причина показана явно.
- «**Требуется ручная проверка**» — документ не распознан или уверенность недостаточна; кейс передаётся специалисту. Агент не выдаёт ложноположительный вывод.

Граничные случаи

- Плохое качество скана — неуверенное поле помечается, статус «ручная проверка», без додумывания значения.
- Обновление правил программы — проверка по актуальной версии с фиксацией номера версии в отчёте.
- Частичный пакет — недостающие документы перечисляются поимённо.

Схема процесса (user flow со статусами)

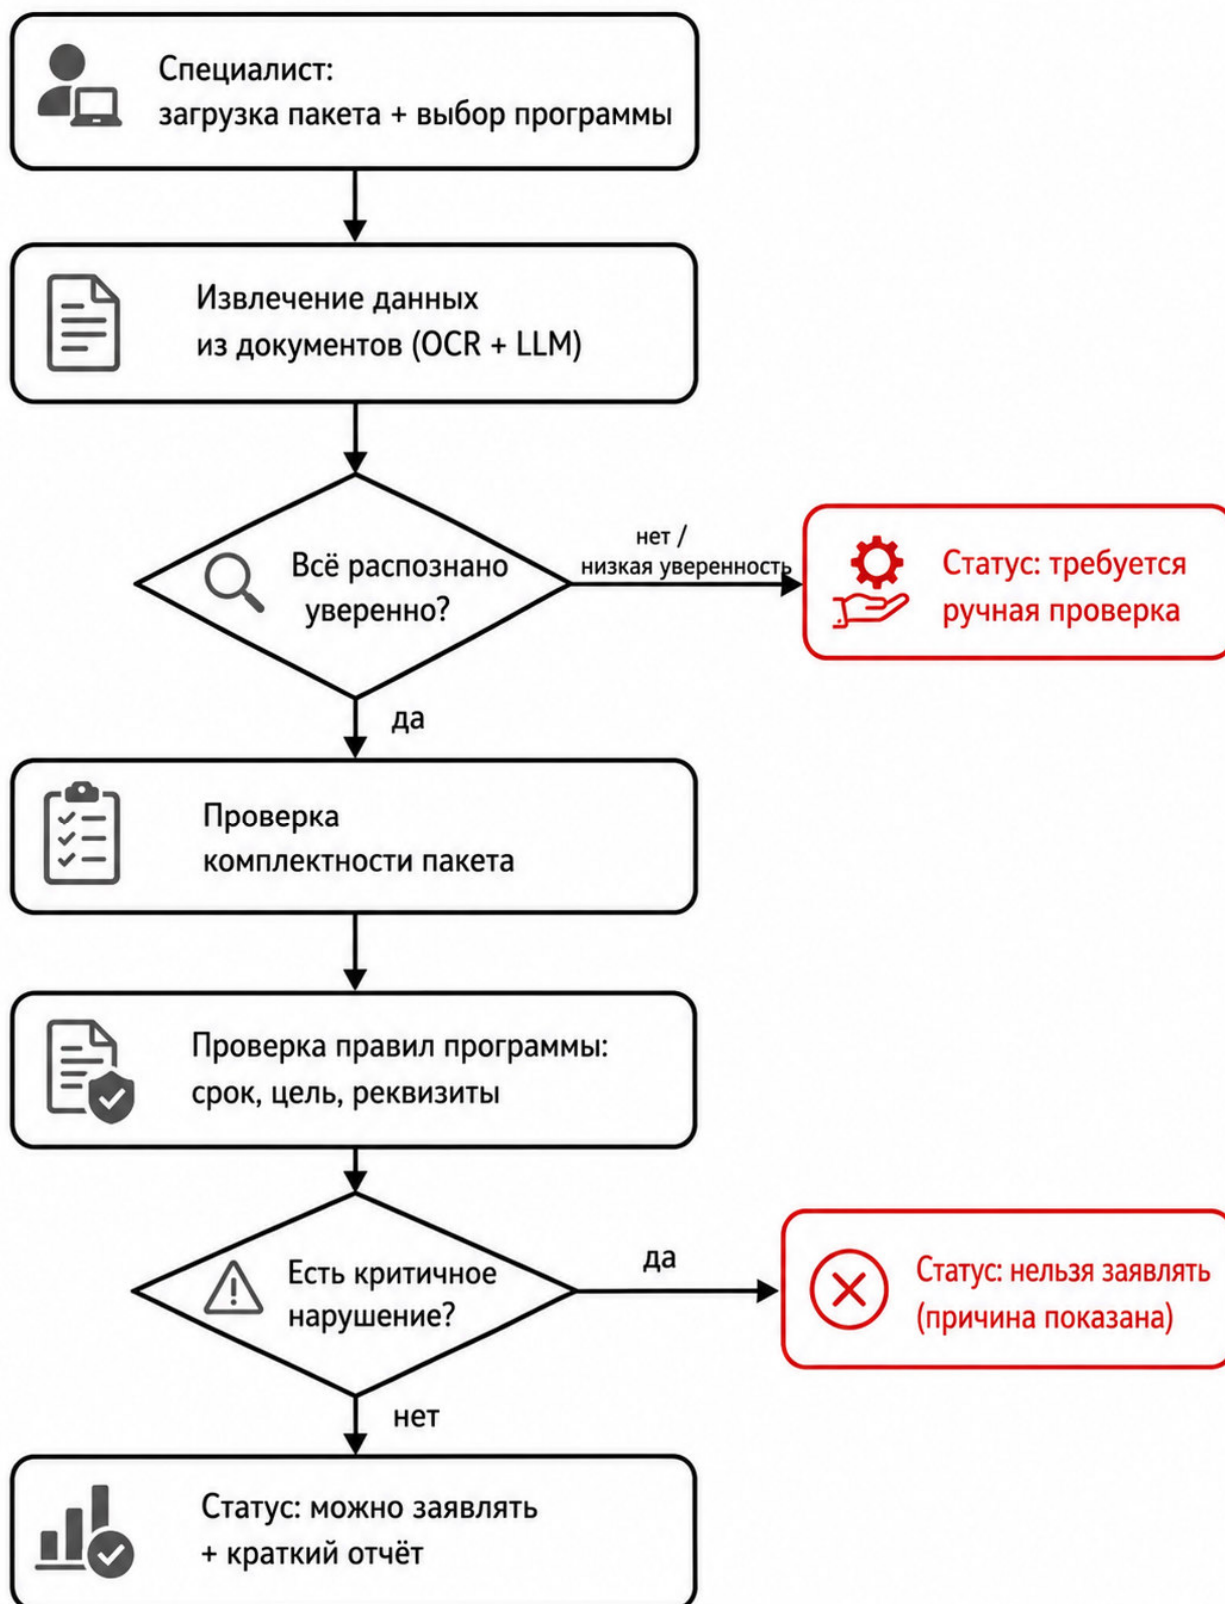

3. Дорожная карта пилота (2 месяца)

Пилот на 8 недель, 6 вех. Для каждой — содержание, критерий готовности и роли.

Стек по дрифту: Python, PostgreSQL, S3, OCR, GigaChat; внешних интеграций в MVP нет.

Срок	Веха	Содержание · критерий готовности · роли
Нед. 1–2	Аналитика и правила программ	Содержание: интервью, формализация правил (1528, областной) в критерии, сбор размеченного набора кейсов, требования ИБ Готовность: правила согласованы; есть набор «прошёл/не прошёл»; определена главная метрика Роли: BA/PM, казначейство, юристы, ИБ
Нед. 2–3	Загрузка и выбор программы	Содержание: интерфейс загрузки, выбор программы, хранение файлов (S3) и метаданных (PostgreSQL) Готовность: пользователь загружает пакет и выбирает программу; всё сохраняется Роли: Backend, Frontend, BA
Нед. 3–5	Извлечение данных (OCR+LLM)	Содержание: распознавание параметров: контрагент, сумма, дата, номенклатура, сроки, подписи/печати Готовность: агент извлекает ключевые поля ≥ порога; нераспознанное помечается Роли: AI/ML, Backend, BA
Нед. 5–6	Проверка по правилам и статусы	Содержание: комплектность, целевое назначение, сроки, реквизиты; статус можно/нельзя/ручная проверка с причиной Готовность: ни одно критичное нарушение не пропущено; статус с причиной Роли: Backend, BA, QA
Нед. 6–7	Пост-контроль закрывающих	Содержание: сопоставление оплаты с закрывающим документом; подсветка пересорта и недопоставки Готовность: расхождения выявляются корректно на тестовых авансах Роли: Backend, BA, QA
Нед. 7–8	Дашборд и приёмка	Содержание: дашборд рисковых кейсов и метрик, выгрузка отчёта, сквозной прогон демо на кейсах клиента Готовность: выполнены условия приёмки; метрика измерена и принята Роли: Frontend, BA/PM, заказчик

Ключевые риски и предупреждение

- **Риск 1** — пропуск запрещённого платежа (нарушение главной метрики) из-за ошибки распознавания или пробела в правилах. Предупреждаем: при недостаточной уверенности агент

выдаёт «ручная проверка», а не «можно»; качество меряем на размеченном наборе реальных кейсов до пилота.

- **Риск 2** — низкое качество и разнородность документов (сканы, разные шаблоны УПД). Предупреждаем: старт с типовых форм и лучших сканов, честно фиксируем контролируемую долю «ручная проверка», покрытие наращиваем итеративно.

Целевые метрики пилота (критерии приёмки)

Числовые ориентиры согласованы с заказчиком как критерии успеха пилота. Главная метрика — непропуск запрещённых платежей — приоритетнее остальных.

Метрика	Цель	Что означает
Точность ответа агента	$\geq 95\%$	агент не пропускает платежи, которые нельзя заявлять в банк
Выявление отсутствующих данных	$\geq 99\%$	документы, подписи, печати, спецификации
Полнота выявления рисков	$\geq 95\%$	доля рискованных пакетов, корректно подсвеченных агентом
Скорость проверки пакета	≤ 10 мин	против часов ручной проверки
Доля кейсов без ручной доработки	растёт от пилота	сколько пакетов агент обрабатывает без оператора
Доля «требуется ручная проверка»	контролируемая	при неуверенности — честный флаг, а не ложное «можно»

Ожидаемый эффект (оценка заказчика): сокращение ошибок пользователей более чем в 5 раз за счёт автоматизации рутинного контроля и передачи спорных кейсов на ручную проверку.

4. Процесс работы с заказчиком и командой

С заказчиком и стейкхолдерами

- Формат: демо инкремента на реальных кейсах + ревью метрик качества и спорных правил программы.
- Частота: раз в 2 недели, плюс письменный статус раз в неделю.
- Фокус: прогресс к метрике «не пропустить запрещённый платёж»; уточнение правил программ; решения по спорным документам и требованиям ИБ.

С командой разработки

- Формат: ежедневный синк (15 мин) + планирование и ретро на границе спринта.
- Частота: ежедневно — синк; еженедельно — планирование; раз в 2 недели — ретро.
- Фокус: блокеры, уточнение правил и граничных случаев OCR, политика статуса «ручная проверка», готовность вехи по чек-листу приёмки.

Принципы коммуникации

- Одно сообщение — одна цель: статус заказчику в терминах ценности и метрики.
- Правила программы — единый источник истины; изменения фиксируются письменно с версией.
- Плохие новости — рано и с вариантом решения.
- Требования ИБ и работа с финдокументами — отдельный трек с самого начала.

5. Мотивация участия в проекте

Почему мне интересен этот проект

Я студент Школы 21 и учусь через практику: беру реальные задачи и довожу их до работающего результата. Проект привлекает тем, что в нём видна вся цепочка бизнес-аналитика — от разговора со стейкхолдерами и формализации правил программы до логики статусов и измеримой метрики. Здесь нельзя спрятаться за общими словами: критерий «агент не должен пропускать запрещённый платёж» либо выполняется, либо нет. Цена ошибки реальная — отказ банка, — и это заставляет проектировать честно, с приоритетом «лучше переспросить, чем пропустить».

Как я вижу свою роль в команде

Мне близка роль на стыке BA и PM: перевести неформальные правила программы и требования казначейства в проверяемые критерии, описать процесс и граничные случаи, а затем удерживать команду на сроках пилота. Вижу себя связующим звеном между заказчиком (что и почему проверяем) и разработкой (как это реализуемо на данных клиента). В Школе 21 я привык к командной работе и взаимному ревью, поэтому формат «заказчик — аналитик — команда» для меня естественная среда. Готов брать формализацию требований, ведение договорённостей и контроль готовности по чек-листу приёмки.

Сколько времени готов уделять

Готов уделять проекту стабильно на протяжении всего пилота (2 месяца), совмещая с обучением: полноценно участвовать в созвонах, аналитике и планировании, брать задачи с чётким сроком и держать темп. Конкретный объём часов в неделю готов зафиксировать на старте, чтобы обязательства были реалистичными и выполнялись без срывов.

Заключение

В работе представлено комплексное бизнес-аналитическое и управленческое решение по созданию AI-агента проверки целевого использования льготных кредитов. Проект рассмотрен целостно — от снятия неопределённости в требованиях до плана двухмесячного пилота с измеримыми критериями приёмки.

Сформулированные вопросы к стейкхолдерам образуют не разрозненный опросник, а логическую систему: они последовательно закрывают риски проекта от стратегического уровня (неверно выбранная цель) до операционного (пропуск запрещённого платежа из-за устаревших правил или неоднозначного документа). Описанный ключевой бизнес-процесс переводит эти требования в конкретную логику работы агента с тремя статусами на выходе, а дорожная карта распределяет

реализацию по шести вехам с ролями, критериями готовности и целевыми метриками. Раздел о работе с заказчиком и командой замыкает картину, определяя, как проект будет управляться на протяжении пилота.

Через все разделы проходит единый принцип – приоритет главной метрики: агент не должен пропускать платежи, которые нельзя проводить за счёт льготного кредита. Именно она задаёт политику поведения системы в спорных ситуациях: при недостаточной уверенности агент обязан выдавать статус «требуется ручная проверка», а не ложноположительное «можно». Этот принцип – прямое следствие проработки требований, и он определяет всю дальнейшую логику: от формулировки статусов до критериев приёмки в 95–99 %.

Предложенный подход обеспечивает баланс автоматизации и контроля: агент берёт на себя рутинную проверку и подсветку рисков, но финальное решение по спорным случаям остаётся за специалистом. Ожидаемый эффект – сокращение ошибок пользователей более чем в пять раз при сохранении полного контроля человека над критичными решениями.

Таким образом, качество бизнес-анализа на этапе постановки задачи напрямую определяет, будет ли построенный агент решать реальную проблему заказчика или лишь имитировать её решение. Проработанные в настоящей работе требования, процесс, план и метрики формируют основу, на которой такой продукт может быть создан осознанно и с предсказуемым результатом.

Список литературы

1. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide). Version 3. – International Institute of Business Analysis (IIBA), 2015.
2. Визерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. – 3-е изд. – М.: Русская редакция; БХВ-Петербург, 2014.
3. Коберн А. Современные методы описания функциональных требований к системам (Writing Effective Use Cases). – М.: Лори, 2011.
4. Гоїхман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация. – М.: ИНФРА-М, 2018. (в части техники интервьюирования и постановки вопросов)
5. ГОСТ Р 57193–2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. – М.: Стандартинформ, 2016.
6. Cadle J., Paul D., Turner P. Business Analysis Techniques: 99 Essential Tools for Success. – BCS, 2014.
